



HELHEDSPLAN VIDEBÆK

HELHEDSPLAN VIDEBÆK: en samskabende proces
Projektbeskrivelse

udarbejdet af Plan & Vejanlæg juni 2019

PROJEKTBEKRIVELSE

SUCCESKRITERIER:

- at det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.

Det gør vi ved en samskabende og involverende proces.

- at helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af udviklingsprojekter.

Det gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere projekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.

- at helhedsplanen kan danne grundlaget for at kunne skabe nye samarbejder og synergier mellem by & land og land & by.

Det gør vi ved at inddrage Videbæk omegn og nærtliggende landsbyer i processen fra starten af og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejds muligheder og synergier.

Hvilken opgave?

Opgaven er at udarbejde en helhedsplan for Videbæk, der kan danne afsæt for og styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter i byen samt at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme så de trækker i samme retning.

Helhedsplanen skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i byens identitet, stolthed og udviklingsmuligheder. Den skal motivere byens borgere og erhvervsfolk til at trække i samme retning, så lokale partnerskaber udvikles.

Hvem kan hjælpe?

Dette spørgsmål besvares gennem en samskabende proces mellem forskellige by- & landaktører fra Videbæk by og omegn.

Repræsentanter fra Videbæk by og omegn inviteres med i processen for at sikre synergi og samspil mellem by og land. I processen betragter vi alle, der har en interesse i Videbæks udvikling, som aktører i stedet for borgere, kommunen, private virksomheder m.fl. På denne måde sættes alle fri af deres traditionelle roller og ansvarsområder og får mulighed for at indgå i samskabelsen om Videbæks udvikling. Vi motiverer aktørerne til at deltage i processen ved at tage udgangspunkt i, hvad de er stolte af samt deres ønsker for Videbæks udvikling. Processens spilleregler meldes klart ud, og vi giver plads til at udvikle og realisere initiativer.

Ambassadørgruppe:

En mindre ambassadørgruppe udpeges og tildeles en særlig rolle. Gruppen går forrest som positive ambassadører for helhedsplanen, og skal være med til at prioritere mellem forskellige ideer og projekter samt at udbrede kendskabet og ejerskabet til helhedsplanen. Ambassadørgruppen vil bestå af fire lokale byråds-politikere, formanden for Videbæk Borgerforening og 1 udvalgt Videbæk borger med et stort netværk samt formanden for Landdisstriksrådet.

Nøgleaktører:

For at styrke den samskabende proces udpeges en række nøgleaktører, som inviteres med ind i processen som aktive deltagere i forhold til kvalificering af helhedsplanen. Nøgleaktørerne skal blandt andet bidrage ved at pege på, hvad de er stolte af. Cirka 15-20 udvalgte Videbæk borgere og repræsentanter fra omegnen udgør gruppen sammen med cirka 5 fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Styregruppe:

Der nedsættes en styregruppe, som skal godkende projektbeskrivelsen og den endelige helhedsplan. Styregruppen består af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Politiske udvalg:

Den endelige helhedsplan bliver sendt til godkendelse i de politiske udvalg samt Byrådet.

Hvilken proces?

Der afholdes et formøde med ambassadørgruppen, hvor forslag til nøgleaktører vil blive drøftet. Efterfølgende inviteres nøgleaktørerne til et formøde.

Alle by- & landaktører inviteres til en Kick-Off Workshop, hvor vi sammen vil se på, hvad vi er stolte af og starte kortlægningen af igangværende projekter og samarbejder i Videbæk og omegn. Til workshoppen åbnes op for en digital Ide-Generator, hvor alle by- & landaktører kan komme med forslag til udvikling af Videbæk by og omegn. Evt. inviteres en aktør fra en af nabokommunerne ind til at perspektivere. Sideløbende med Kick-Off Workshoppen åbner en digital Ide-Generator, hvor alle kan komme med input til helhedsplanen. I 10 uger vil Ide-Generatoren være åben for input.

Efterfølgende etablerer kommunen et åbent værksted i Videbæk by. Det åbne værksted giver mulighed for, at alle aktører kan kigge forbi og komme med ideer til udviklingen af helhedsplanen. Et udkast til helhedsplanen bliver til undervejs i det åbne værksted i dialogen med de fremmødte aktører.

Udkastet til helhedsplanen bliver trykprøvet og kvalitetssikret på en Workshop med de udvalgte nøgleaktører. På Workshoppen vil nøgleaktørerne fra Videbæk og omegn samt fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune samskabe om fokusering og kvalitetssikring af helhedsplanen. Derudover vil der være en intern høring blandt fagpersoner i Ringkøbing-Skjern Kommune for at sikre helhedsplanens realiseringspotentialer.


Ambassadørgruppen vil løbende blive involveret til at foretage de nødvendige prioriteringer i processen inden den endelige helhedsplan vedtages i Byrådet.

Som et led i den samskabende proces inviteres alle aktører til et 'Parat-til-Start' møde, hvor den vedtagne helhedsplan præsenteres. Det primære formål vil være organisering og etablering af projektgrupper samt at hjælpe projektgrupperne godt fra start i forhold til realisering af helhedsplanen. Afslutningsvis udstilles helhedsplanen i byen. Formålet med udstillingen er at formidle helhedsplanen bredt ud til alle i Videbæk og omegn. Helhedsplanen vil også blive kommunikeret bredt ud via digitale kanaler.

PRODUKTET

ANALYSE AF DE EKSISTERENDE FORHOLD + KORTLÆGNING AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER

BY- & LAND-AKTØR INITIATIVER

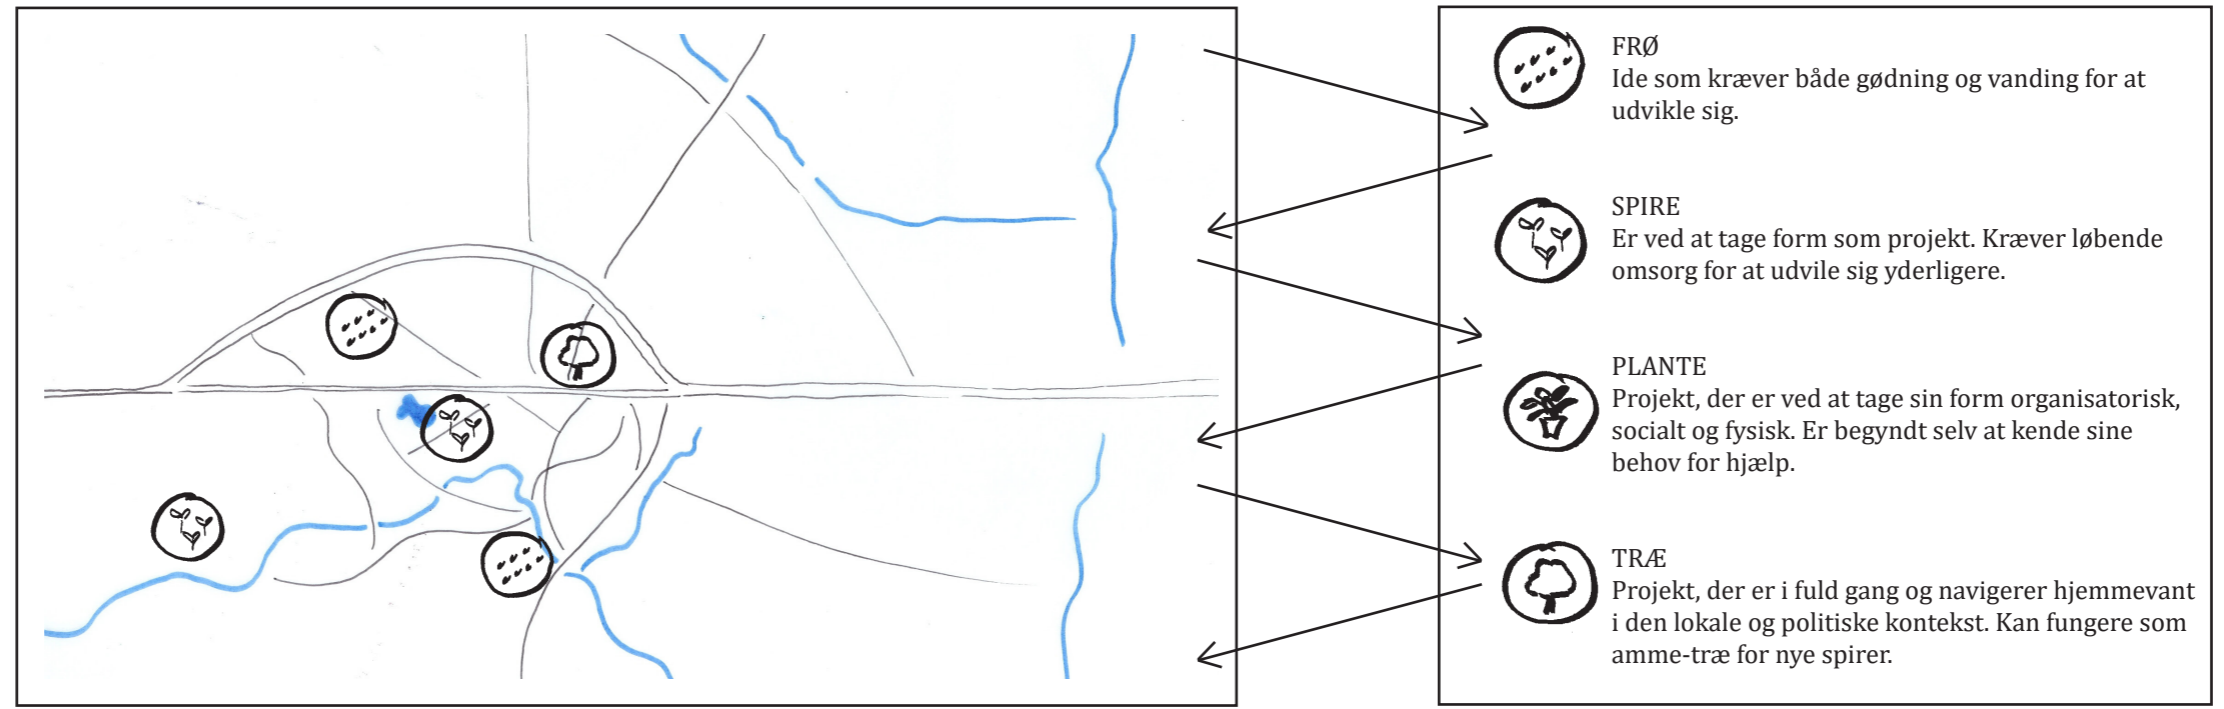


HELHEDSPLAN

STRATEGISKE BY-TEMAER

VISION FOR VIDEBÆK + FYSISK HOVEDGREB + GEOGRAFISKE FOKUSOMRÅDER

HANDLINGSKATALOG

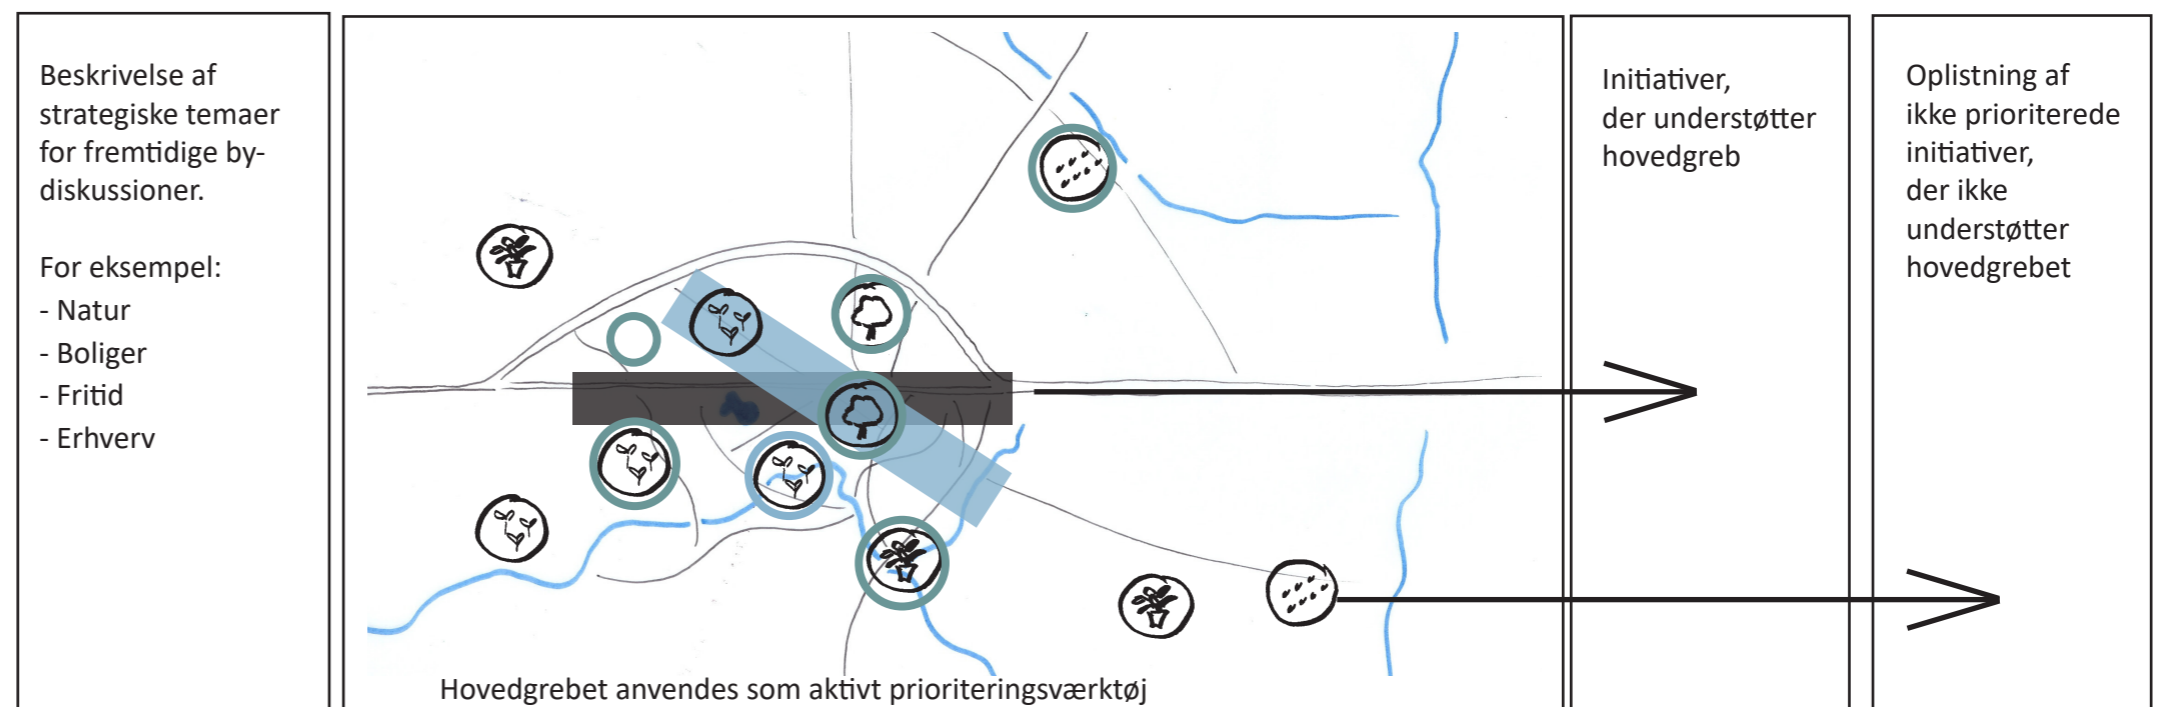

HELHEDSPPLAN VIDEBÆK: en samskabende proces

ORGANISERING & ROLLEFORDELING


juni 2019

		HVEM ER MED?	HVILKE ROLLE?
INPUT- & HANDLINGSNIVEAU	LANDAKTØRER FRA VIDEBÆK OMEGN	Alle i Videbæks omegn samt nærtliggende landsbyer	Åbner op for nye relationer, samarbejder og synergier mellem Videbæk og omegnen
	BYAKTØRER FRA VIDEBÆK BY	Alle med en tilknytning til Videbæk	Byder ind med ideer til udvikling af Videbæk og omegn
	NØGLEAKTØRGRUPPE	15-20 udvalgte Videbæk borgere og repræsentanter fra omegnen samt cirka 5 fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune	Sikrer lokal forankring ift. igangværende tiltag. Fagpersoner kvalitetssikrer og sikrer realiseringspotential
PLANLÆGNINGS- & KOORDINERINGSNIVEAU	EKSTERNE RÅDGIVERE	Konsulentbistand	Bidrager med faglig sparring og kvalitetssikring
	PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING	Projektleder samt sparringspartner fra RSKK Plan og vejanlæg	Sikrer fremdrift og kommunikation mellem aktører
BESLUTNINGS- & PRIORITERINGSNIVEAU	AMBASSADØRGRUPPE	Fire lokale byrådspolitikere, formand for Videbæk Borgerforening, formand for Landdistriktsrådet samt en ekstra udvalgt Videbæk borger	Løbende prioritering og positive ambassadører for helhedsplanen
	STYREGRUPPE	Formand for Økonomiudvalget, Formand for Teknik & Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen	Løbende godkendelse og sikring af ressourcer til projektet
	POLITISKE UDVALG	Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet	Godkender helhedsplanen

HELHEDSPLAN VIDEBÆK: en samskabende proces

juni 2019

PROCESPLAN

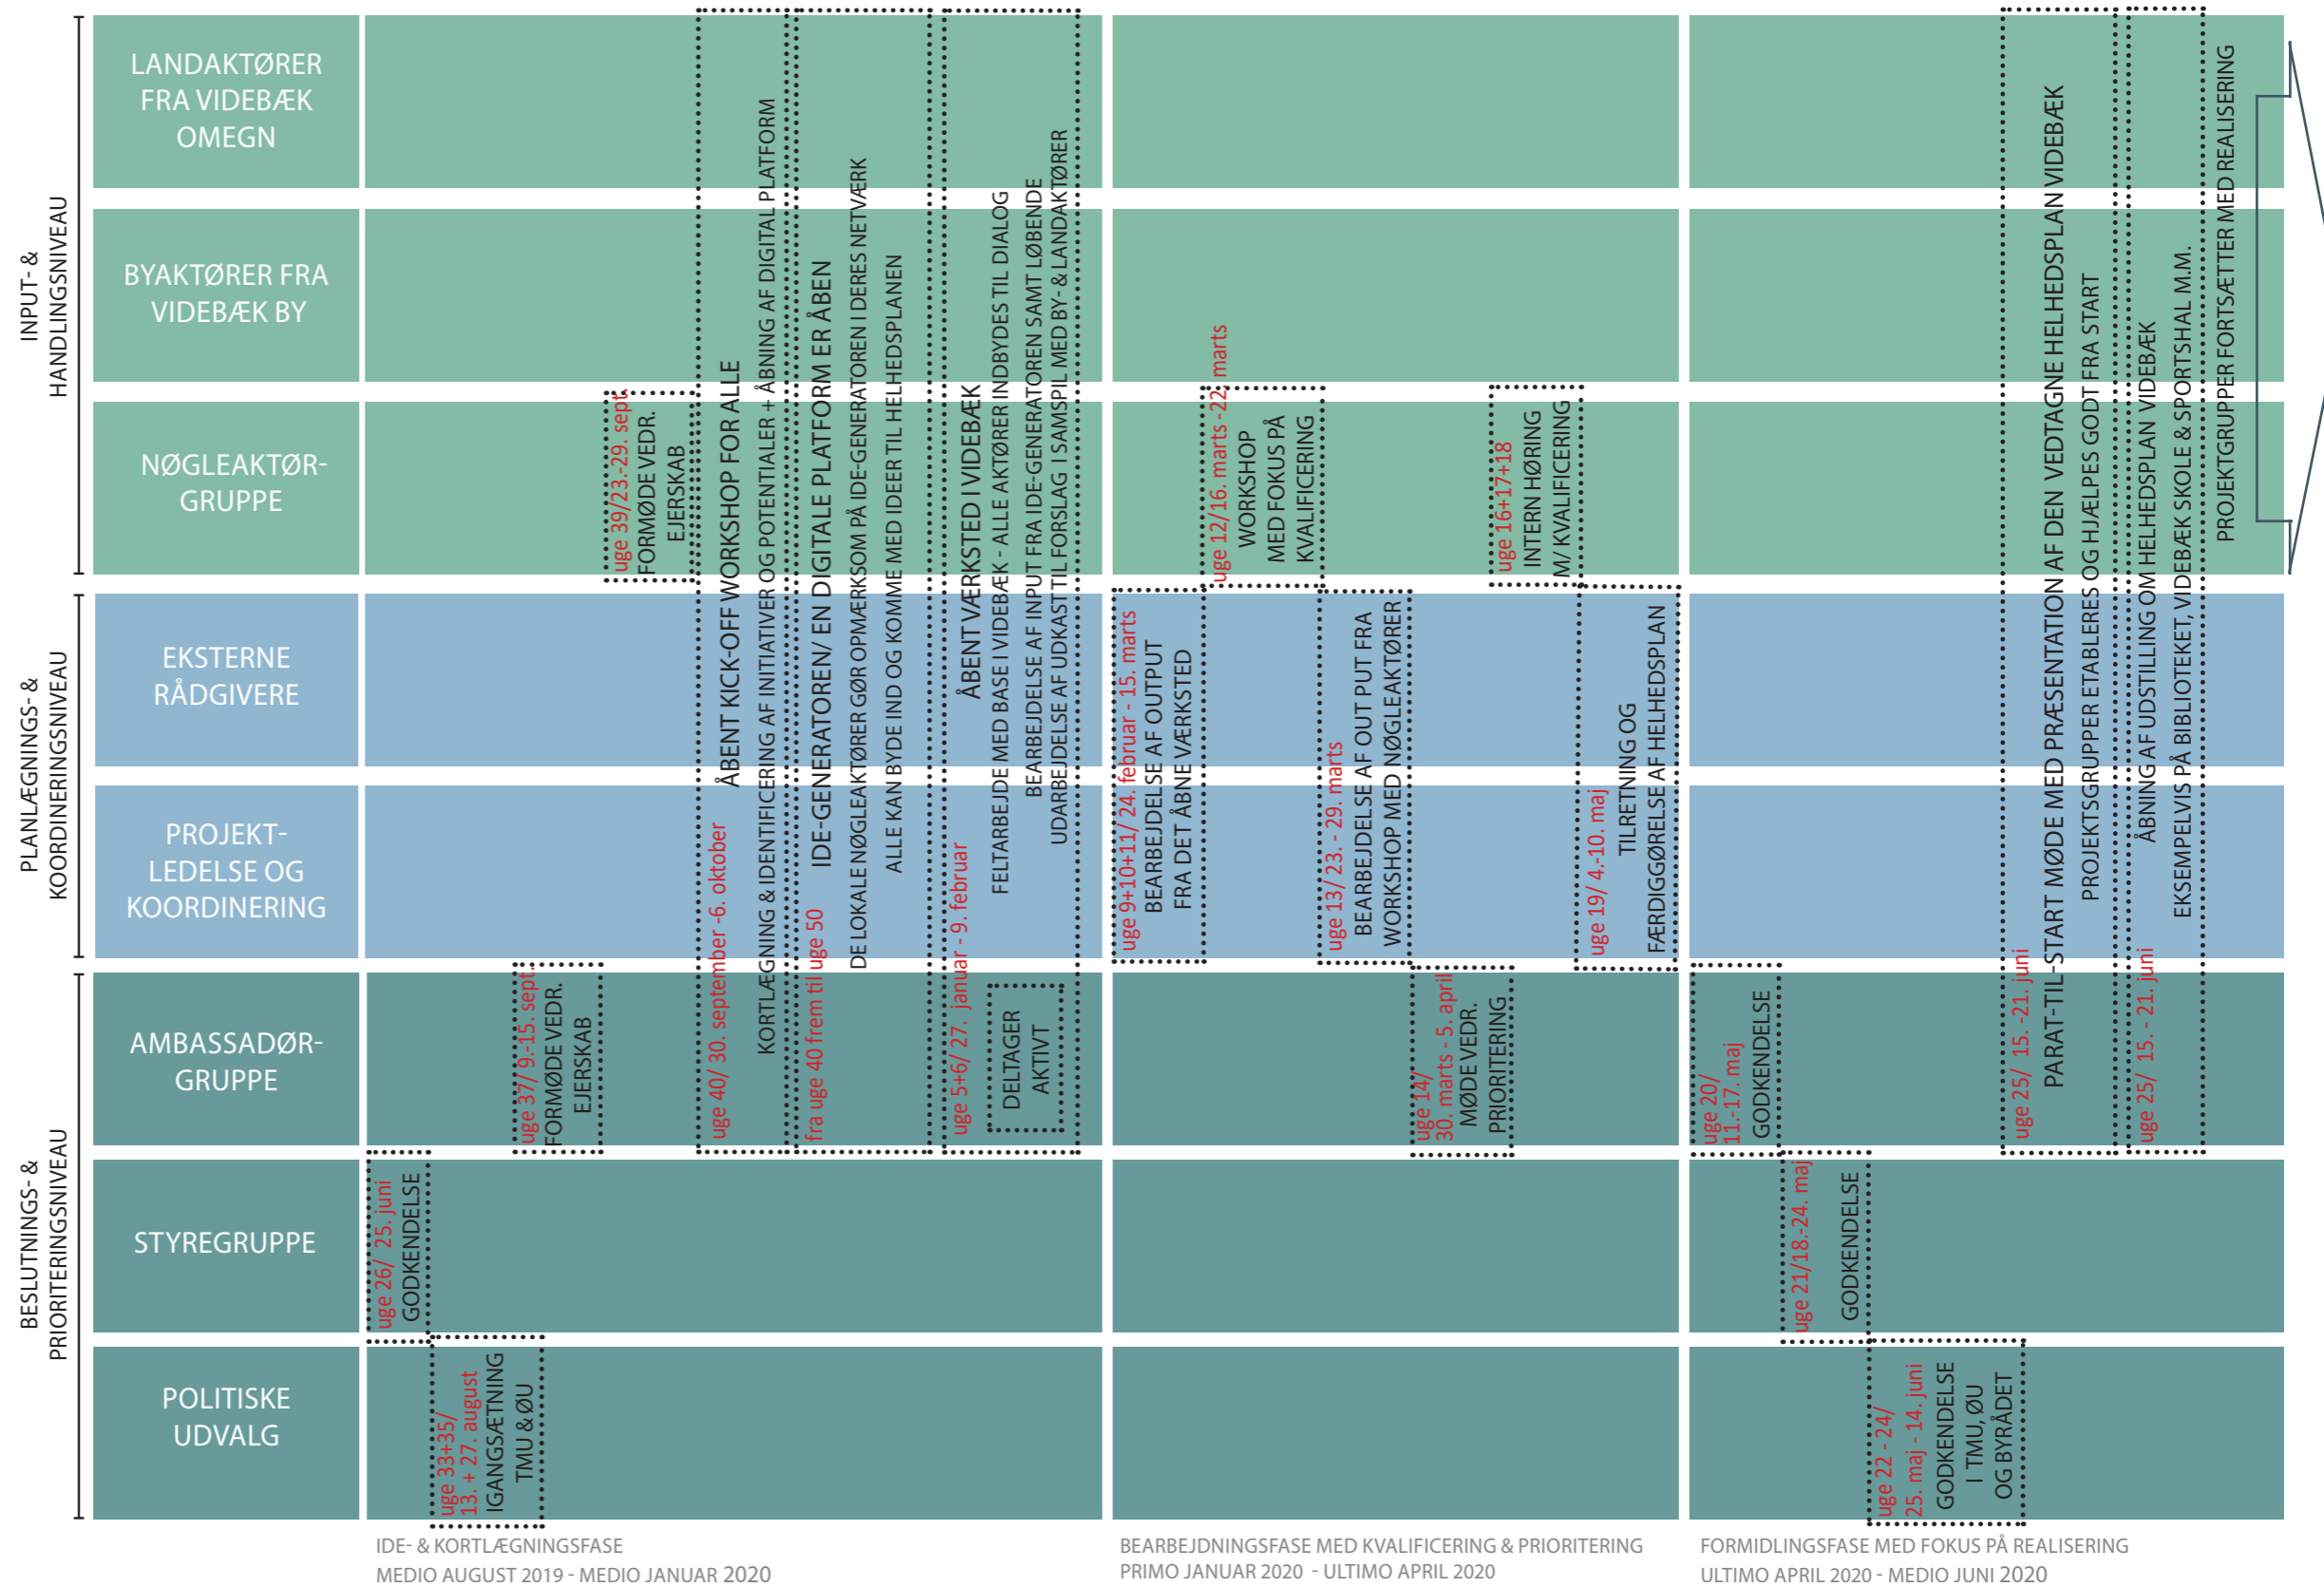

HELHEDSPLAN VIDEBÆK: en samskabende proces

juni 2019

MØDEOVERSIGT

		FORMÅL MED MØDET	OUT-PUT FRA MØDET
uge 26 den 25/6	1. MØDE M/ STYREGRUPPEN	Etablering af Styregruppen, gennemgang af projektbeskrivelsen samt drøftelse af ambassadørgruppens sammensætning	Godkendelse af projektbeskrivelse
uge 33 - 35 den 13/8 + 27/8	1. BEHANDLING I DE POLITISKE UDVALG	Politisk behandling	Godkendelse af projektbeskrivelse
uge 37 primo september	1. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN	Først og fremmest ejerskab samt drøftelse af nøgleaktører	Udvælgelse af nøgleaktørgruppe
uge 39 medio september	1. MØDE MED LOKALE NØGLEAKTØRGRUPPEN	Først og fremmest ejerskab samt drøftelse af om nogle nøgleaktører mangler	Mobilisering af lokale nøgleaktører
uge 40 ultimo september	1. WORKSHOP M/NØGLEAKTØRGRUPPEN OG ALLE AKTØRER	Brainstorm over stoltheder og potentialer samt en kortlægning af igangværende projekter og initiativer	Oversigt over igangværende projekter
uge 5 + 6 efteråret 2019	2. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN -DEL AF DET ÅBNE VÆRKSTED	En direkte involvering af ambassadørerne i dialogen med alle by- & landaktørerne	Større ejerskab og bedre kendskab til projektet
uge 12 primo marst 2020	2. WORKSHOP M/ NØGLEAKTØRGRUPPEN	En åben dialog om projektet på tværs af interessegrupper	Kvalificering og sikring af realiseringspotentialet
uge 14 medio marst 2020	3. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN	En gennemgang af ideer og initiativer samt en belysning af hvordan hovedgrebet for helhedsplanen kan se ud	En prioritering af initiativer og ideer samt udvælgelse af geografiske fokusområder
uge 16 + 17 + 18 marts 2020	INTERN HØRING BLANDT FAGPERSONER I RSKS	Kvalificering og sikring af realiseringspotentialet	Godkendelse af projektet hos Ekstern Udvikling samt Land, By & Kultur's faggrupper
uge 20 medio april	4. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN	Præsentation af den endelige helhedsplan for Videbæk	Godkendelse af helhedsplanen for Videbæk
uge 21 april 2020	2. MØDE M/ STYREGRUPPEN	Præsentation af den endelige helhedsplan for Videbæk	Godkendelse af helhedsplanen for Videbæk
uge 22 -24 maj/ juni 2020	2. BEHANDLING I DE POLITISKE UDVALG	Politisk behandling af den endelige helhedsplan for Videbæk	Vedtagelse af helhedsplan for Videbæk
uge 25 juni 2020	'PARAT-TIL-START' MØDE M/ ALLE AKTØRER	Præsentation af den endelige helhedsplan for Videbæk	Projektgrupper etableres og arbejder videre mod realisering
det videre forløb	PROJEKTGRUPPER FORTSÆTTER MOD REALISERING		
